

Landkreis Nordsachsen




Historie Breitbandausbau im Landkreis Nordsachsen

Fakten und Meilensteine

Projektteam Breitband

Fakten „Weiße Flecken“

- Investitionsvolumen gesamt 102,2 Millionen Euro
- größte Investition in der Geschichte des Landkreises Nordsachsen
- 90 % Fördermittel Bund und Land
- 28 von 30 Kommunen im Landkreis werden erschlossen (Schkeuditz und Eilenburg Ausbau durch eigene Projekte)
- 6 Projektgebiete
- 243 Ortsteile werden im gesamten Projektzeitraum ausgebaut
- Aufgreifschwelle 30 Mbit/s

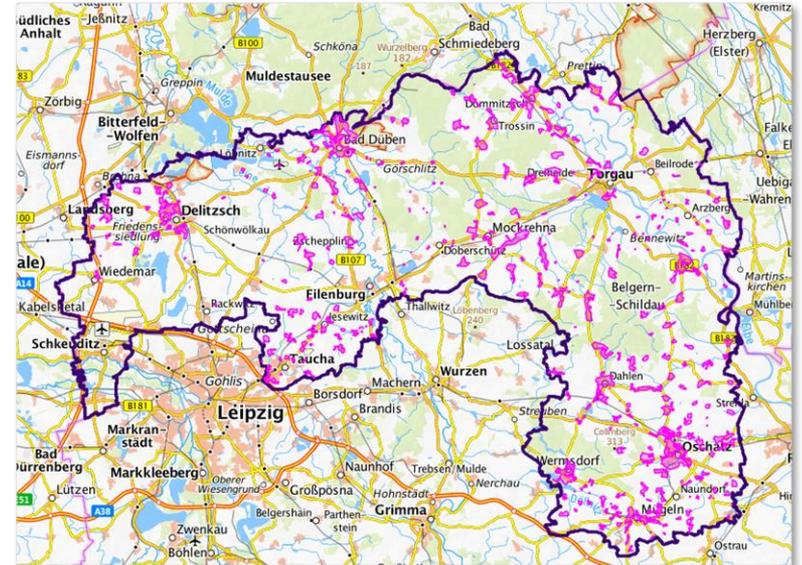

Ausbaubereiche im Landkreis Nordsachsen

Fakten „Weiße Flecken“

- > 44.650 private Haushalte, > 3.350 Unternehmen und 71 Schulen werden bis Ende 2021 angeschlossen
- > 7.823 Kilometer Glasfaserkabel
- > 1.300 Kilometer Tiefbauarbeiten
- > 900 Glasfaser-Verteiler
- 1.483 Kilometer Leerrohre
- mit Glasfasernetz werden Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s möglich
- FTTH Ausbau



Historie

2014/2015

- Infrastrukturanalyse; Ergebnis: digitale Versorgung des Landkreises als eines der größten Defizite

2015/16

- Breitbandstudie, Ergebnis: > 48.000 Haushalte im Landkreis unterversorgt;
förderfähig < 30 Mbit/s Download-Übertragungsrate = förderfähig

2016

- Einstellung Projektkoordinator Breitband
- Landkreis Nordsachsen hat Fördermittelanträge zum investiven Breitbandausbau gestellt
- Erhalt vorläufiger Fördermittelbescheide
- Antrag Kofinanzierung Land
- Antrag Beratungs- und Planungsleistungen Land

2017

- Beginn der Ausschreibung; umfasste aufgrund der Komplexität drei Angebotsphasen



Unterlagen erste Submission

Historie

2018

- Juni 2018: ausführendes Unternehmen nach europaweiter Ausschreibung: Telekom Deutschland GmbH
- Offizielle Zuschlagserteilung 1. Juli 2018
- Offizielle Eigentümerakquise 1. Dezember 2018 bis 28. Februar 2019, (interne Verlängerung durch Telekom bis 31. August 2020)
- Rücklaufquote Ergebnis: 78,9 % (Stand 11. Februar 2021)
→ bundesweit ein hervorragendes Ergebnis
- 16. August 2018: Auftaktveranstaltung mit den Bürgermeistern
- September 2018: Beginn der Feinplanungen Telekom
- September/ Oktober 2018: Bürgerversammlungen in den 6 Projektgebieten (Delitzscher Land, Bad Düben, Torgau, Belgern-Schildau, Oschatz, Mügeln/ Wernsdorf)



Bürgerinformationsveranstaltung in Delitzsch

Historie

- Oktober 2018: Einstellung Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit
- 17. Oktober 2018: Vertragsunterzeichnung Zuwendungsverträge Telekom durch Landrat Emanuel vollzogen
- Investitionsvolumen: knapp 94 Millionen Euro
- 31. Oktober 2018: Eingang abschließende Zuwendungsbescheide des Bundes
- 19. Dezember 2018: Staatssekretär Stefan Brangs übergibt an Landrat Emanuel Kofinanzierungsbescheide des Landes
- 27. Dezember 2018: Rücklauf gegengezeichnete Zuwendungsverträge von Telekom Deutschland GmbH




Quelle: SMWA

Historie

2019

- 6. März 2019: Clustergespräche Projektteam Breitband LRA und Telekom mit Bürgermeistern und Breitbandverantwortlichen der Kommunen in Torgau und Oschatz
- 12. März 2019: Clustergespräche Projektteam Breitband LRA und Telekom mit Bürgermeistern und Breitbandverantwortlichen der Kommunen in Dahlen und Wermsdorf
- 14. März 2019: Clustergespräche Projektteam Breitband LRA und Telekom mit Bürgermeistern und Breitbandverantwortlichen der Kommunen in Delitzsch und Bad Dübén

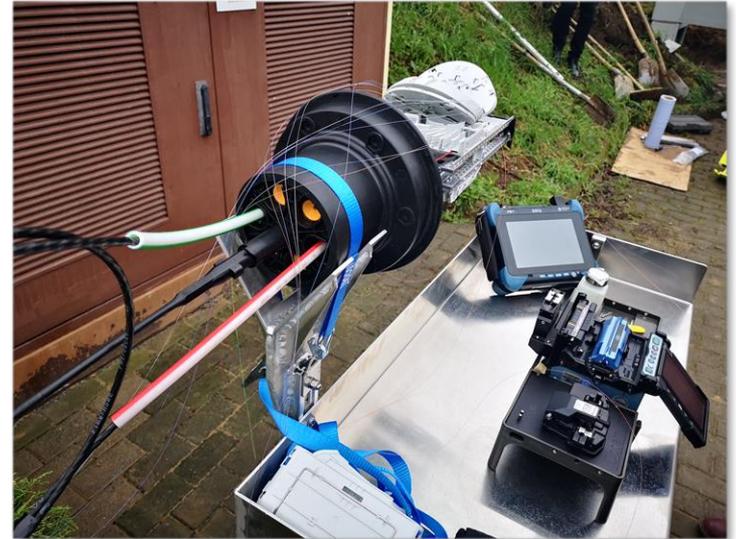

Gerät zum Spleißen von Glasfasern

Historie

- 28. März 2019: großer offizieller Baustart in Mügeln (Projektgebiet Mügeln/ Wermsdorf)
- 30. April 2019: Baustart in Jesewitz (Projektgebiet Delitzscher Land)
- Mai 2019: Einstellung Bauingenieur
- 11. Juli 2019: Baustart in Liebschützberg (Projektgebiet Oschatz)
- 16. Juli 2019: Baustart in Cavertitz (Projektgebiet Belgern-Schildau)



Baustart in Mügeln

Historie

- 20. August 2019: Baustart in Kossa (Projektgebiet Bad Düben)
- 26. September 2019: Baustart im letzten der sechs Cluster in Elsnig (Projektgebiet Torgau)
- 22. Oktober 2019: Abfrage verbindliches Nachtragsangebot bei Telekom
- 25. Oktober 2019: Baustellenbesuch von Oberbürgermeister Herrn Kretschmar im Oschatzer Stadtteil Merkwitz
- 8. November 2019: Unterzeichnung Vertragsnachträge (Mittelabruf, Anpassung Zahlungsbedingungen) durch Landrat Emanuel (durch Telekom 27. September 2019)



Baustart in Laußig Ortsteil Kossa

Historie

- November 2019: erste Rechnungsstellung der Telekom über rund 4,3 Mio. Euro
- 22. November 2019: Eingang verbindliches Nachtragsangebot der Telekom (8,267 Mio. Euro)
- 25.-29. November 2019: Baukontrolle Baustellen durch ateneKOM (Ergebnis: entsprechen den Standards, keine Beanstandungen durch den Prüfer)
- 19. Dezember 2019: Inbetriebnahme des ersten Teilabschnittes Glasfasernetz in den Ortsteilen Gallen und Ochelmitz (Jesewitz)
- seitdem werden kontinuierlich weitere Abschnitte in Betrieb genommen



Inbetriebnahme in Jesewitz Ortsteil Gallen

Historie

Kennzahlen Stand 31.12.2019

- in 39 Ortsteilen Abschluss der Tiefbaubauarbeiten
- in 73 Ortsteilen Erbringung von ca. 250 Kilometer Tiefbau
- 292 km Glasfaserkabel verlegt
- 163 Glasfaser-Verteiler gestellt
- ca. 100 Haushalte buchbar



Bauarbeiten im Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst

Historie

2020

- März 2020: zweite Rechnungsstellung der Telekom über rund 15,3 Mio. Euro
- 31. März 2020 Gespräch: Landrat Emanuel/ Telekom: Herr Vogler (Leiter Technik Niederlassung Ost)
- 20. April 2020: Versand Informationsschreiben des Landrates an Kommunen bzgl. Gewährleistungsfrist
- 30. April 2020, 5. Mai 2020, 7. Mai 2020: erneute Clustergespräche Projektteam Breitband LRA und Telekom mit allen Bürgermeistern und Breitbandverantwortlichen der Kommunen (via WebEx Telefonkonferenz wegen Corona)
- 13. Mai 2020: Unterzeichnung Änderungsverträge Vertrags-erweiterung (349 Nachtragsadressen) sowie Bekanntgabe Vertragserweiterung und Projektverlängerung bis Ende 2021
- Investitionsvolumen: gesamt 102,2 Millionen Euro
- August 2020: dritte Rechnungsstellung der Telekom über rund 17,69 Mio. Euro

Historie

- November 2020: vierte Rechnungsstellung der Telekom über rund 16,39 Mio. Euro

Kennzahlen Stand 31. Dezember 2020

- in 74 Ortsteilen Abschluss der Tiefbau- und Montagearbeiten
- 61 Ortsteile buchbar (39 Ortsteile komplett, 22 Ortsteile teilweise)
- 3.921 buchbare Adressen (entspricht 5.147 Haushalten)



Matthias Patzsch, Projektleiter Telekom

Historie

2021

- April 2021: fünfte Rechnungsstellung der Telekom über rund 12,7 Mio. Euro
- 13. April 2021: Gespräch Landrat, Frau Schladitz, Herr Trodler/
Telekom: Herr Vogler, Herr Hemmann, Herr Patzsch

Kennzahlen Stand 30. Juni 2021

- in 174 Ortsteilen Abschluss der Tiefbau- und Montagearbeiten
- 156 Ortsteile buchbar (100 Ortsteile komplett, 56 Ortsteile teilweise)
- 9.142 buchbare Adressen (entspricht 13.836 Haushalten)



Danny Trodler,
Projektkoordinator Breitband des Landkreises

Historie

- Juli 2021: Fristverlängerung sämtlicher Markterkundungsverfahren durch Telekom erbeten wegen notwendiger interner Systemumstellung (Ende neu: 25. August 2021)
- 20. Juli 2021: Gespräch Landrat Emanuel, Frau Schladitz/ Telekom: Herr Wenzke (Konzernbevollmächtigter), Herr Lange (Stellvertreter)



Bauarbeiten in Badrina

Historie

- August 2021: sechste Rechnungsstellung der Telekom über rund 8,3 Mio. Euro
- 13. September 2021: Gespräch Herr Trodler/ ateneKOM: Daniel Knohr (Regionalleiter), Ellen Greifeneder in Köllitsch, Lehr- und Versuchsgut



v.l.n.r.: Daniel Knohr, Ondrej Kunze, Ellen Greifeneder, Rene Vetter, Holger Reinboth, Danny Trodler

Historie

- 21. September 2021: Arbeitstreffen in Döbernitz, Pressetermin

Kennzahlen Stand 30. September 2021

- in 213 Ortsteilen Abschluss der Tiefbau- und Montagearbeiten
- 186 Ortsteile buchbar (148 Ortsteile komplett, 38 Ortsteile teilweise)
- 14.004 buchbare Adressen (entspricht 22.549 Haushalten)



Arbeitstreffen in Döbernitz

Historie

- 1. Oktober 2021: beschränkte Ausschreibung für Auswertung Markterkundungsverfahren
- Oktober 2021: siebte Rechnungsstellung der Telekom über rund 3,5 Mio. Euro
- 15. November 2021 Änderungsanträge Mittelverschiebung Bund versendet
- 16. November 2021 Änderungsanträge Mittelverschiebung Land versendet
- 8. Dezember 2021 Anträge Verlängerung Bewilligungszeitraum Bund und Land versendet

Historie

- Eingang Änderungsbescheide Verlängerung Bewilligungszeitraum/ Mittelverschiebung für alle sechs Projektgebiete (LDS am 20. Dezember 2021, ateneKOM am 23. Dezember 2021)

Kennzahlen Stand 31. Dezember 2021

- in 243 Ortsteilen Abschluss der Tiefbau- und Montagearbeiten
- 224 Ortsteile buchbar (195 Ortsteile komplett, 29 Ortsteile teilweise)

Historie

- 25. und 27. Januar 2022 Sprechstunde Breitband für Kommunen via Webex (Schwerpunkt Sachstand Ausbau „Weiße Flecken“ sowie Grundlagen Förderung „Graue Flecken“ und Auswertung vorläufige Ergebnisse des MEV)
- Frühjahr 2022: Abschlussveranstaltung geplant



Projektteam Breitband
v.l.n.r.: Danny Trodler, Silke Bechtloff, Uta Schladitz, Mathias Dörge
